

ALLEGATO "A"

Comune di S BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di AP

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: POLO SCOLASTICO "M. CURZI" - 3 LOTTO - REALIZZAZIONE LOCALI PER TRASFERIMENTO UFFICI

COMMITTENTE: Comune di San Benedetto del Tronto.

CANTIERE: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, S BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

S BENEDETTO DEL TRONTO, 20/03/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO DI CONCETTO ALFREDO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Settore Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche Davarpanah Farnush)

ARCHITETTO DI CONCETTO ALFREDO

VIALE A DE GASPERI 120
63074 S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Tel.: 0735794308 - Fax: 0735794309
E-Mail: diconcettoa@comunesbt.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	4	12/06/2017	15/06/2017
INGRESSO DI SERVIZIO CANTIERE. Montaggio ponteggio fronte nord per accesso al piano secondo	1	E	4	4	12/06/2017	15/06/2017
OPERE EDILI						
Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.	2	E	5	5	19/06/2017	23/06/2017
Demolizione di tamponature eseguita a mano	2	E	5	5	19/06/2017	23/06/2017
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2	E	5	5	19/06/2017	23/06/2017
Realizzazione di divisori interni in muratura per i servizi	2	E	5	5	26/06/2017	30/06/2017
Realizzazione di pareti in cartongesso	2	E	14	18	26/06/2017	13/07/2017
Realizzazione di controsoffitti	2	E	3	3	22/08/2017	24/08/2017
Posa di pavimenti e rivestimenti per interni in ceramica	2	E	3	3	28/06/2017	30/06/2017
Posa di pavimenti in laminato e battiscopa	2	E	5	7	28/06/2017	04/07/2017
Montaggio di serramenti interni	2	E	5	5	03/07/2017	07/07/2017
Tinteggiatura di superfici interne	2	E	10	12	10/07/2017	21/07/2017
Posa di recinzioni e cancellate	2	E	3	3	04/09/2017	06/09/2017
Impianti Elettrici.						
Realizzazione di impianto elettrico - distribuzione generale e quadri	3	E	14	18	11/07/2017	28/07/2017
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	3	E	8	10	24/07/2017	02/08/2017
Istallazione corpi illuminanti	3	E	8	12	21/07/2017	01/08/2017
Impianto rivelazione incendi	3	E	8	10	26/07/2017	04/08/2017
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	3	E	1	1	24/07/2017	24/07/2017
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	3	E	4	4	25/07/2017	28/07/2017
IMPIANTO IDROTERMOSANITARIO						
Distribuzione generale	4	E	10	12	24/07/2017	04/08/2017
Allacci idrici e termosifoni	4	E	10	15	02/08/2017	16/08/2017
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	4	E	6	8	21/08/2017	28/08/2017
Installazione termosifoni	4	E	2	2	17/08/2017	18/08/2017
FINITURE E CHIUSURA LAVORI						
Smobilizzo del cantiere	5	E	4	4	11/09/2017	14/09/2017

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA 1
- 2) = ZONA 2
- 3) = ZONA 3
- 4) = ZONA 4
- 5) = ZONA 5


I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

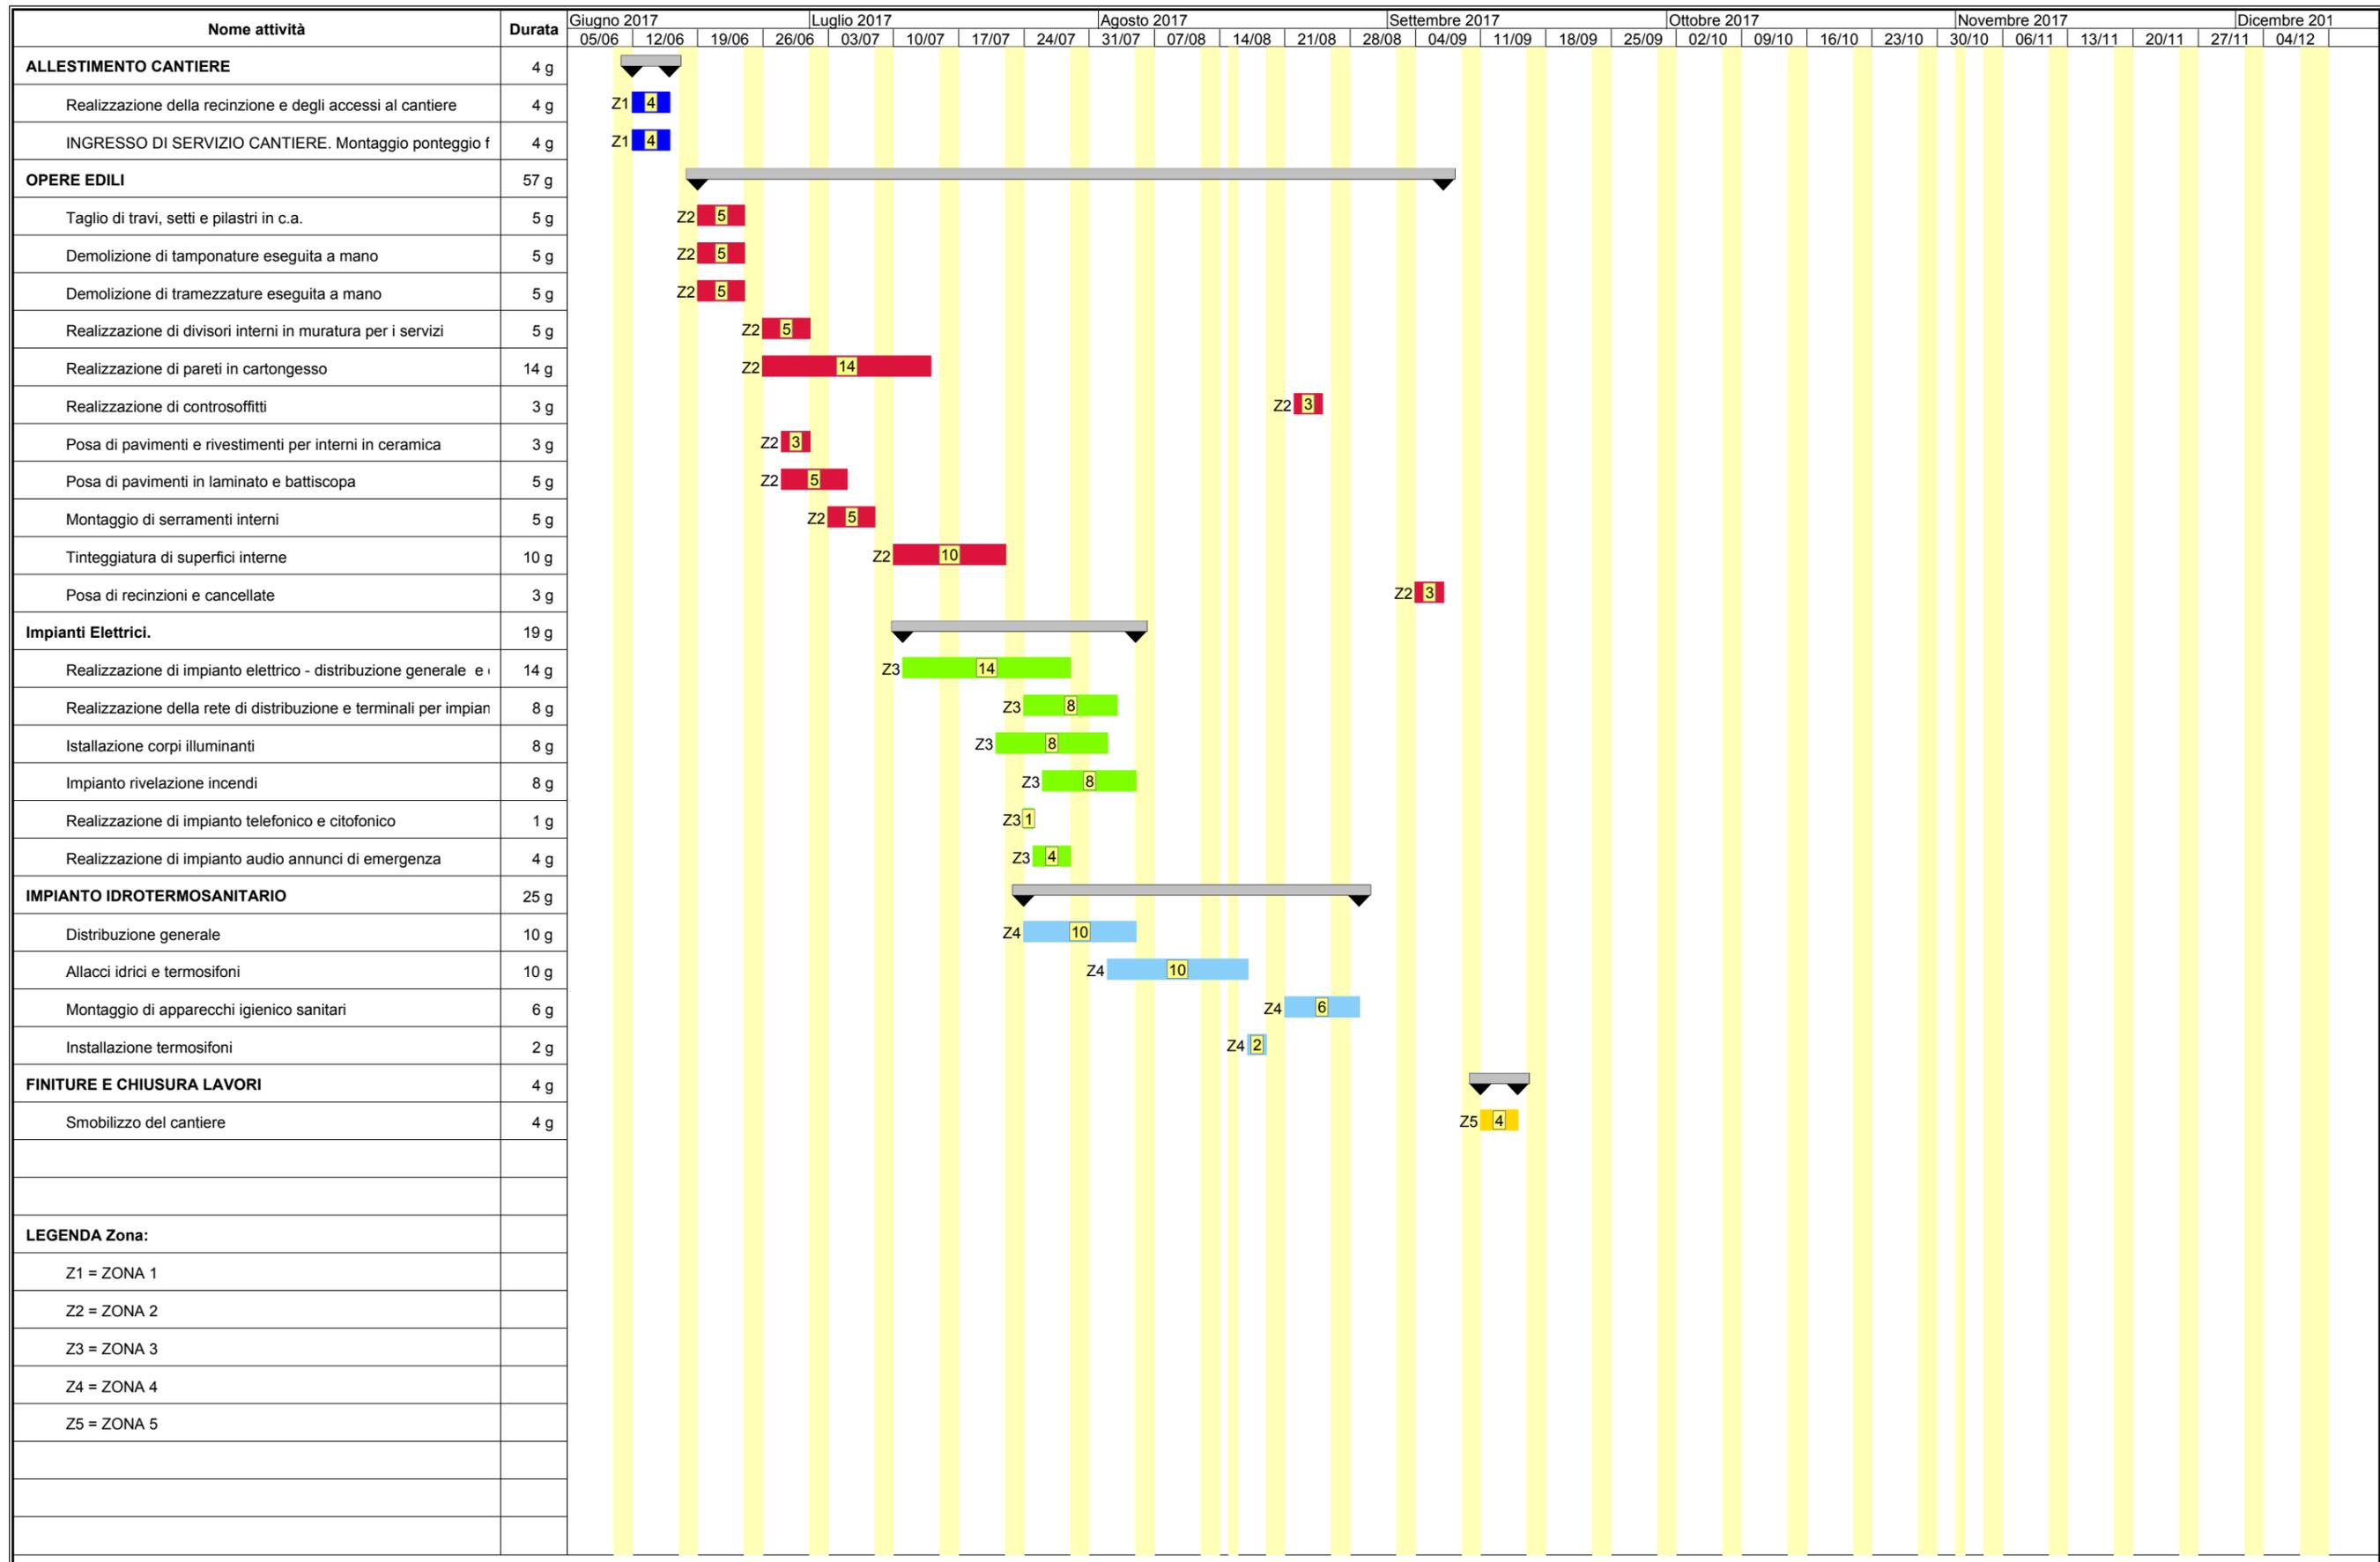

LEGENDA Zona:

- Z1 = ZONA 1
- Z2 = ZONA 2
- Z3 = ZONA 3
- Z4 = ZONA 4
- Z5 = ZONA 5
